# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Início da obra: 01/05/2023

Semana de exibição: 1
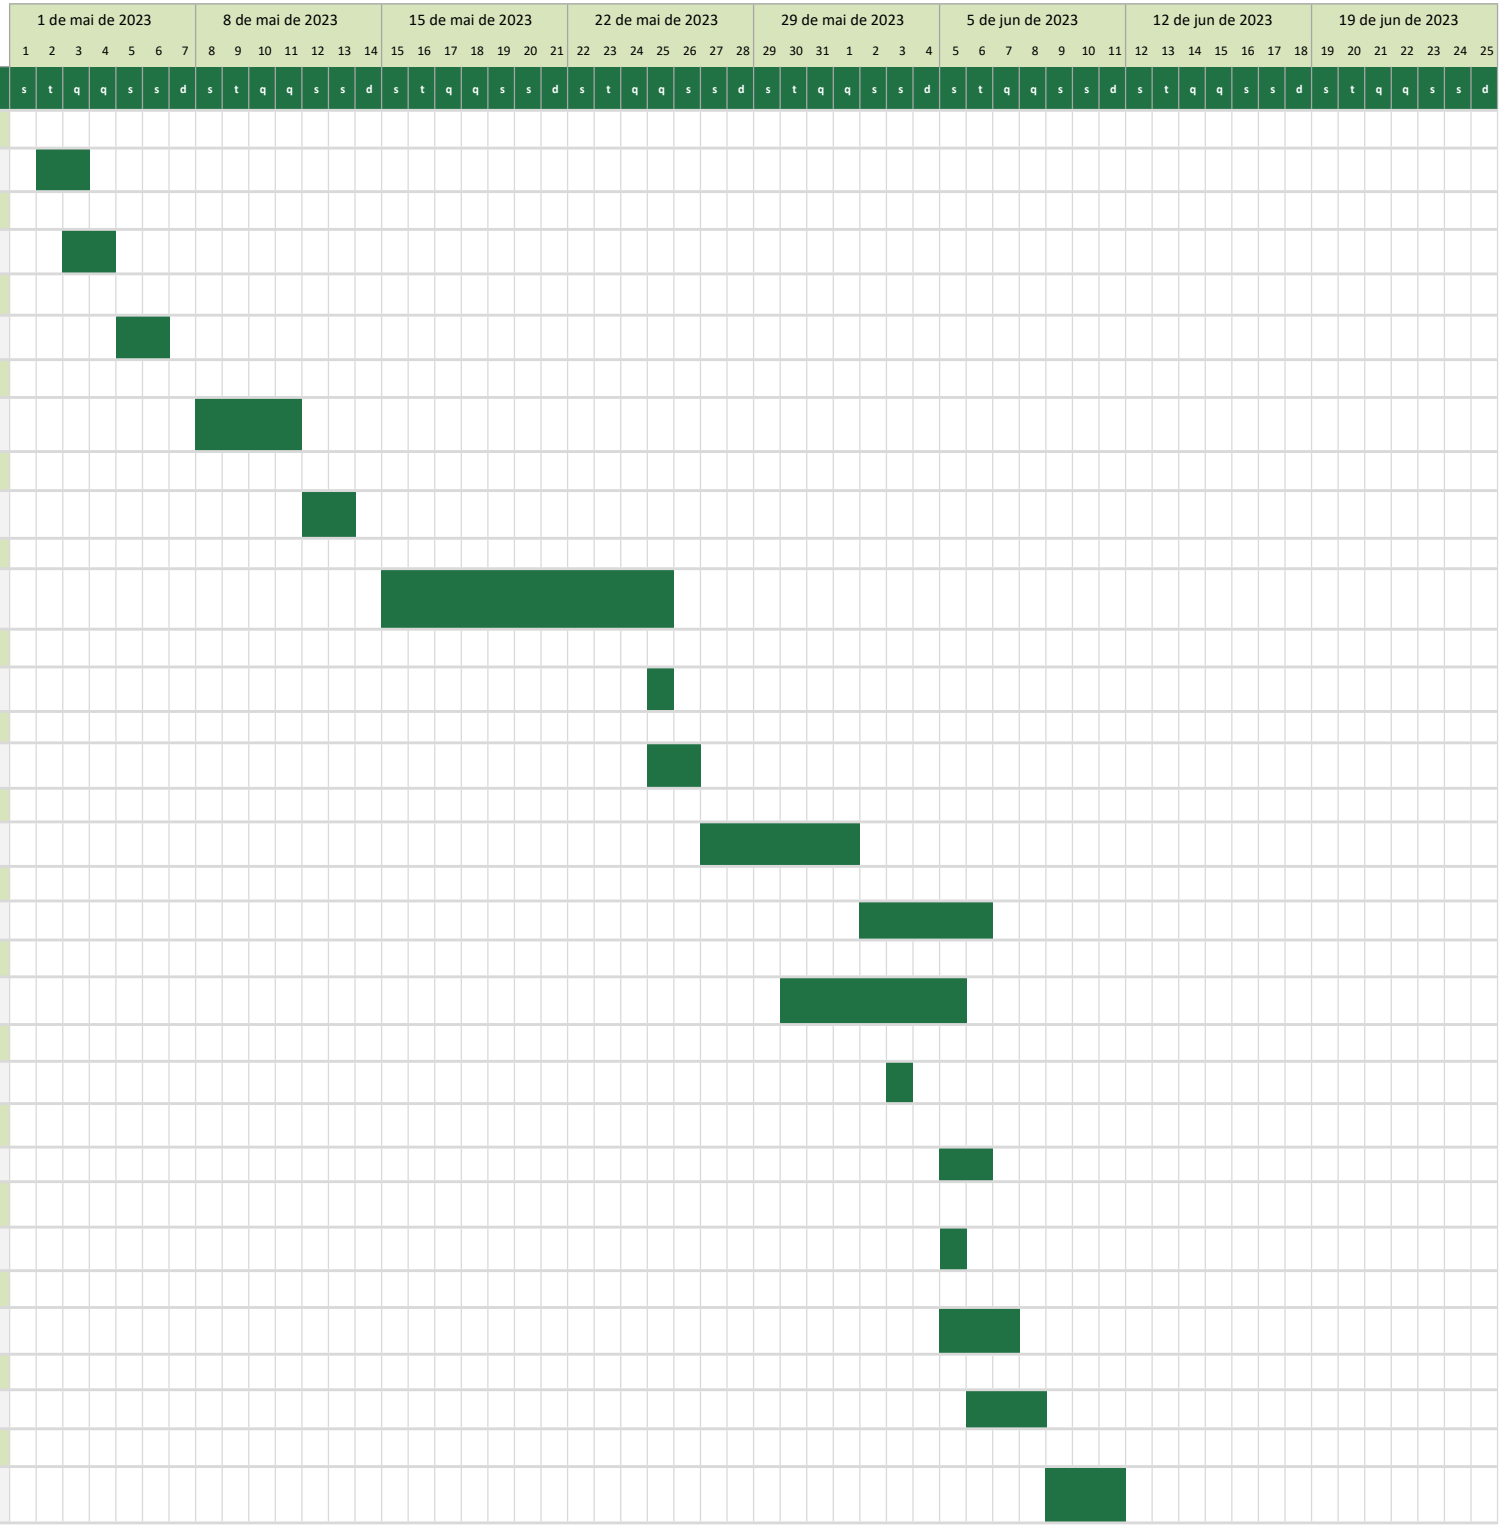
| TAREFA | RESPONSÁVEL | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | |
| DOCUMENTAÇÃO E LICENÇAS | Construtora | 100% | 2/5/23 | 3/5/23 |
| **REMOÇÃO DAS GRADES** | | | | |
| QUEBRA E RETIRADA DAS GRADES | Construtora | 100% | 3/5/23 | 4/5/23 |
| **DEMOLIÇÃO DA ESCADARIA PARA O 2° PISO** | | | | |
| CORTE DOS PILARES E ESCADA | Construtora | 100% | 5/5/23 | 6/5/23 |
| **CORTE DOS PILARES** | | | | |
| CORTE DOS PILARES COM SERRA, MARTELETE E TALHADEIRA | Construtora | 100% | 8/5/23 | 11/5/23 |
| **CHAPÉU DOS PILARES** | | | | |
| ASSENTAMENTO DO GRANITO | Construtora | 100% | 12/5/23 | 13/5/23 |
| **MURO DE CONTENÇÃO NA CERCA DE VIDRO** | | | | |
| DEMOLIÇÃO DO REBOCO E CONFECÇÃO DE PAREDE COM REBOCO | Construtora | 100% | 15/5/23 | 25/5/23 |
| **SISTEMA DE DRENAGEM** | | | | |
| MONTAGEM DA REDE DE DRENAGEM | Construtora | 100% | 25/5/23 | 25/5/23 |
| **ATERRO** | | | | |
| ATERRO MECANIZADO | Construtora | 100% | 25/5/23 | 26/5/23 |
| **CALÇADA** | | | | |
| ELABORAÇÃO DA CALÇADA | Construtora | 100% | 27/5/23 | 1/6/23 |
| **ILUMINAÇÃO** | | | | |
| ELABORAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO | Construtora | 100% | 2/6/23 | 6/6/23 |
| **VIDROS** | | | | |
| COLOCAÇÃO DOS VIDROS | Construtora | 100% | 30/5/23 | 5/6/23 |
| **ÁGUA FRIA** | | | | |
| INSTALAÇÃO DA REDE | Construtora | 100% | 3/6/23 | 3/6/23 |
| **PORTÃO DA GARAGEM** | | | | |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | Construtora | 100% | 5/6/23 | 6/6/23 |
| **RELOCAÇÃO PORTÃO METÁLICO** | | | | |
| REINSTALAÇÃO | Construtora | 100% | 5/6/23 | 5/6/23 |
| **CORRIMÃO** | | | | |
| COLOCAÇÃO NA ESCADA E ENTRADE DE DEFICIENTE | Construtora | 100% | 5/6/23 | 7/6/23 |
| **POÇO DE LUZ** | | | | |
| PISO CERÂMICO E CAIXA SIFONADA | Construtora | 100% | 6/6/23 | 8/6/23 |
| **REVESTIMENTO PAREDE TANQUE** | | | | |
| REVESTIMENTIO COM PISO CERÂMICO E TANQUE | Construtora | 100% | 9/6/23 | 11/6/23 |
